



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
เลขที่ ๗๗๗/๖๕๕
วันที่ ๖๖ ๓๓ ๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่

ที่ ศธ.๐๖๕๔.๑๑/ ๗๗๗

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ด้วย งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร เพื่อให้ศาลาพระพุทธรูป มีโครงสร้างที่แข็งแรง สวยงาม วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี นั้น

ในการนี้งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายประยูร ภูมิทอง)
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ลงชื่อ.....

(นายสายชล ศิษย์ถาชี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ.....

(นายปัญญา ตั้งธโนปัจจัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

“เรียนดี มีความสุข”

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ความสอดคล้อง 8 ประเด็นการพัฒนา (8 Agenda)		ผู้รับผิดชอบ	ภาพกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 3.3 สร้างและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด		งานอาคารสถานที่		1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป	1.เชิงปริมาณ 1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป จำนวน 1 หลัง 2.เชิงคุณภาพ 2.1 ศาลาพระพุทธรูป ที่สะอาดมีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	กิจกรรมดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ปัญหา - อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ตุลาคม 2567 ถึง กุมภาพันธ์ 2568	200,000 บาท	1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3.กำหนดดำเนินงานโครงการ 4.สรุปผลและรายงานผล	งานอาคารสถานที่ สามารถพัฒนาปรับปรุงศาลาพระพุทธรูป ทำให้วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่สวยงาม	-	-
..... (นายประยูร ภูมิทอง) ผู้รายงาน		 (นายปัญญา ตั้งธโนปัจจัย) รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร	 (นายสายชล ศิษยาชี) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	 (นายชาติรี จำปาศรี) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร	

ได้จัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว.....หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป
สำหรับงานอาคารสถานที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป สำหรับงานอาคารสถานที่ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงานได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนา การดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประเมินผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพอุทอง อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

งานอาคารสถานที่
คณะผู้จัดทำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร จะต้องมีแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ หากแต่วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี เป็นผลทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลาพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมด้านโครงสร้าง เกิดปูนแตกร้าวจากระยะเวลานาน พื้นปูนมีการทรุดของดินทำให้เกิดภาพลักษณ์ภูมิทัศน์ ไม่สวยงามเพราะเป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยฯ

ทางงานอาคารสถานที่จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขึ้นมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้สวยงาม

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

1.3 เป้าหมาย

1.3.1 เชิงปริมาณ

1.3.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป จำนวน 1 หลัง

1.3.2 เชิงคุณภาพ

1.3.2.1 ศาลาพระพุทธรูป สวยงาม สะอาด

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้

1.4.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ บุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 งานอาคารสถานที่ สามารถปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูปได้สวยงาม สะอาด วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี เป็นผลทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีลำดับเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

• ผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

• เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการเรียนรู้วิชาชีพ ด้วยรูปแบบวิธีการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของคนทุกช่วงวัย

• เสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

• ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคต และเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในระดับชาติและระดับสากล

• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

• พัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางการทำงาน

OVEC ONE Team : พัฒนาอาชีวศึกษา "ทำดี ทำได้ ทำทันที"

นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา : 8 ประเด็นการพัฒนา (8 Agenda)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนรู้

1.2 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม ทันสมัย

1.3 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย (Vocational Edion for All)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ปฏิรูประบบอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.2 เสริมสร้างคุณภาพให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง (Quality for Al)

2.3 ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศติดตาม

- 2.4 ขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิตอาชีวศึกษา (Credit Bank)
- 2.5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในทุกมิติ (วิชาชีพ วิชาการ วิชาชีพชีวิต)
- 2.6 พัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนและสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา (Coaching)
- 2.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
- 2.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างอาชีวศึกษาแห่งความสุข ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาแห่งความสุข (ห้องเรียนดี สุขาดี ฯลฯ)
- 3.2 เสริมสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและวิทยาลัยสีขาว
- 3.3 สร้างและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Skill Certificate)

- 4.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ตามแนวทาง Up-Skill / Re-Skill / New-Skill
- 4.2 ขับเคลื่อนการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)
- 4.3 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)
- 4.4 เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Entrepreneurship)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาภาคีเครือข่ายและเสริมพลังความร่วมมือ

- 5.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
- 5.2 ขับเคลื่อนและเสริมพลังกลไก อ.กรอ.อศ.
- 5.3 เชื่อมโยงการจัดการศึกษาภายในกระทรวงศึกษาธิการ (Connex MOE)
- 5.4 ผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ (Active MOU/MOA)

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา

- 6.1 พัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลทุกมิติ
- 6.2 แก้ไขปัญหาความขาดแคลนครู บุคลากร และส่งเสริมครูคืนถิ่น
- 6.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาทักษะด้านการเงินแก่ครูและบุคลากร
- 6.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สู่การเป็นบุคลากรอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่

- 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม Fix it - จิตอาสา
- 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุน Soft Power อาชีวศึกษา
- 7.3 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่ตอบโจทย์สังคม
- 7.4 เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น/สร้างต้นแบบรุ่นพี่อาชีวะ (Senior idol)

ประเด็นการพัฒนาที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

- 8.1 ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 8.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
- 8.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน
- 8.4 ปรับปรุงและแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ให้มีความทันสมัย

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพอุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้นำวงจรคุณภาพของเดมมิง PDCA มาใช้ในการดำเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้

- 3.1 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)
- 3.2 ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)
- 3.3 ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)
- 3.4 ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)

3.1 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)

ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้

- 3.1.1 ประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างหัวหน้างาน แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน
- 3.1.2 จัดทำโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- 3.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตามความเหมาะสม
- 3.1.4 สร้างความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ
- 3.1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง (ถ้ามี)
- 3.1.6 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีประเมินผล

3.2 ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)

การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

- 3.2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ
- 3.2.2 ดำเนินการงานตามโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2568 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายใน วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

3.3 ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)

3.3.1 ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

3.3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

- | | |
|-----------|---|
| 4.51-5.00 | หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด |
| 3.51-4.50 | หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก |
| 2.51-3.50 | หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง |
| 1.51-2.50 | หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย |
| 1.00-1.50 | หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด |

3.3.3 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content Analysis)

3.3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

- 1) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: $\bar{X}$)
- 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)

3.3.5 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

3.4. ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)

เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4

ผลการดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)

ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำโครงการเป็นอย่างดี และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการนี้ตามความเหมาะสม สร้างความเข้าใจคณะกรรมการและผู้รับจ้างเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีประเมินผล ตามลำดับ

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)

การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทอง งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพอุทอง พบว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทอง ในวิทยาลัยการอาชีพอุทอง ให้ความร่วมมือในการดำเนินการด้วยดี

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)

การวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการได้เก็บข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจจากการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทอง ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวน และร้อยละข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล จำแนกตาม เพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	32	52.46
หญิง	29	47.54
รวม	61	100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศ ชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเป็นเพศ หญิง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50

ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวน และร้อยละข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล จำแนกตาม สถานะภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร	61	100
อื่นๆ	0	0.00
รวม	61	100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร งานอาคารสถานที่

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่	4.35	0.58	มาก
2. ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายใน	4.3	0.78	มาก
3. ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ในการปรับปรุง และพัฒนางานอาคารสถานที่	4.6	0.67	มากที่สุด
4. ความพึงพอใจต่อความสามารถในการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางานอาคารสถานที่	4.1	0.83	มาก
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของงานอาคารสถานที่	4.1	1.05	มาก
รวม	4.29	0.57	มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร งานอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X}=4.29, S.D. = 0.57$)

เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดพิธีการที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด($\bar{X}=4.6, S.D. = 0.67$) รองลงมาคือวัตถุประสงค์ของพิธีการในการจัดกิจกรรม ที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ($\bar{X}=4.35, S.D. = 0.58$) และน้อยที่สุดคือวิธีการจัดรูปแบบ/กิจกรรมที่ใช้ในพิธีการ อยู่ในระดับ มาก ($\bar{X}=4.10, S.D. = 0.83$)

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)

เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ โดยการแจกแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลแล้วสรุปผลการประเมิน ดังนี้

5.1 สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการฯ จากรายการประเมิน 5 รายการ มีรายการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด 1 รายการ และระดับมาก 4 รายการ โดยอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ในการปรับปรุง และพัฒนางานอาคารสถานที่ 4.60 รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ มีระดับความพึงพอใจที่ 4.35 ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายใน มีระดับความพึงพอใจที่ 4.3 มีความพึงพอใจในระดับ มาก ความพึงพอใจต่อความสามารถในการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา งานอาคารสถานที่ มีระดับความพึงพอใจที่ 4.1 มีความพึงพอใจในระดับ มาก ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของงานอาคารสถานที่ มีระดับความพึงพอใจที่ 4.1 มีความพึงพอใจในระดับ มาก

5.2 อภิปรายผล

- จากการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯ ในจากรายการประเมิน 2 รายการโดยรายการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ รายละเอียดของเนื้อหาโดยรวมมีความเหมาะสม

5.3 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

5.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับความ พึงพอใจ ในตามโครงการ

รายละเอียดของเนื้อหาโดยรวมมีความเหมาะสมตามตาราง

ข้อเสนอแนะ

-

ภาคผนวก

สำเนาบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
เลขที่ ๕๑๕.16๒56
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๖
เวลา ๑๒.๓๐ ร.

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/ ๕๖๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตดำเนินโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ตามทำงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับอนุมัติโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
พระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตดำเนินโครงการดังกล่าว
โดยใช้งบประมาณครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายประยูร ภูมิทอง)

ตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย

๑.เพื่อโปรดทราบ

๒.เห็นควร อนุมัติ

(นายปัญญา ตั้งโนปจัย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายละเอียดที่จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพรพิสัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
แผนก/งาน อาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประยูร ภูมิทอง

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	รวมเงิน
	ค่าใช้สอย	๑ งาน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
รวม				๑๘๐,๐๐๐

ลงชื่อ

(นายประยูร ภูมิทอง)

ผู้ใช้พัสดุ/ผู้ขอซื้อได้ตรวจรายการโดยละเอียดแล้ว ขอรับว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายเขาวลิต กิระสัทธานนท์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
เลขที่ ๕๘ ๓๖๕๔
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๕
เวลา ๑๔.๓๐ น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/ ๕๑๔

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตปรับโครงการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ตามที่งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรได้เสนอ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ซึ่งได้รับอนุมัติและบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้เบิกจ่ายโดยใช้งบ รายได้สถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร ขอปรับโครงการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร	ขอปรับงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๘
ยอดจัดสรรตามโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร		๑๘๐,๐๐๐
เพิ่ม/ปรับ: ☒ ค่าใช้สอย ☐ ค่าตอบแทน ☐ วัสดุ	ใช้งบประมาณ รายได้สถานศึกษา	๑๘๐,๐๐๐+ ๒๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนบาทถ้วน)		๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : แนบโครงการชุดเดิม(ถ้ามี) และโครงการที่ขอรับอนุมัติใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ..... (นาย..... ๖๕๐๖) ผู้รับผิดชอบโครงการ	☐ ทราบ ☐ เห็นชอบ ☒ อนุญาต ☐ อนุมัติ
ความเห็นรองฯฝ่าย..... ๐๔/๒/๖๘	มอบ
ลงชื่อ..... (นายปัญญา ตั้งโนบจัย) รองผู้อำนวยการฝ่าย.....	ลงชื่อ..... (นายชาติรี จำปาศรี) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร



โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

๒. ลักษณะโครงการ : ☒ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
☐ โครงการตามภาระงานประจำ
☐ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

แผนกวิชา/งาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่าย : บริหารทรัพยากร

๑. นายปัญญา ตั้งโนปจัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๒. นายประยูร ภูมิทอง หัวหน้างานอาคารสถานที่
๓. นายเดชพล จิตต์ใจนำ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย

๔.๑ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ด้านที่ ๖ การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

แนวทางที่ ๖.๓ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความ
จำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔.๒ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๕ ด้าน

ด้านที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency)

ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driving) ๘ ประเด็น

ประเด็นที่ ๕.๔ ยกระดับการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐

(PMQA ๔.๐) และ ITA รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน

๔.๓ พันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

๔.๔ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ

๔.๕ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

(✓) พอประมาณ (✓) มีเหตุผล (✓) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไข

(✓) ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

(✓) คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)

สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(✓) วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

๔.๖ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ประการที่ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

๑๑. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

☒ เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐบาล☐ เงินงบประมาณ☐ ปวช.☐ ปวส.☐ ระยะสั้น☐ งบเงินอุดหนุน ระบุ.....☐ งบรายจ่ายอื่น ระบุ.....

ที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้สอย	๑๘๐,๐๐๐	
	รวมจำนวนเงิน	๑๘๐,๐๐๐	

๑๒. การติดตามและประเมินผล

๑๒.๑ แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

๑๒.๒ แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑) ศาลาพระพุทธรูป สวยงาม สะอาด

เห็นสมควรอนุมัติโครงการ ลงชื่อ ✓ (นายประยูร ภูมิทอง) ผู้เสนอโครงการ	เห็นสมควรอนุมัติโครงการ ลงชื่อ [Signature] (นายปัญญา ตั้งโนบจัย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ความเห็นหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ☒ โครงการมีในแผน ☒ โครงการไม่มีในแผน ☒ เห็นสมควรอนุมัติ ☐ เห็นสมควรไม่อนุมัติเพราะ..... ยอดเงินที่จัดสรรให้..... ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดเงินที่ขอ..... ๑๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ..... ๑๐๐.๐๐ บาท ลงชื่อ [Signature] (นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์) หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ	ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ☒ เห็นสมควรอนุมัติ ☐ เห็นสมควรไม่อนุมัติเพราะ..... ลงชื่อ [Signature] (นายสายชล ศิษย์ฤาษี) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ..... ลงชื่อ [Signature] (นายชาติรี จำปาศรี) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง	

รายละเอียดที่จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพรพิสัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
แผนก/งาน อาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประยูร ภูมิทอง

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	รวมเงิน
	ค่าใช้สอย	๑ งาน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
	รวม			๑๘๐,๐๐๐

ลงชื่อ 
(นายประยูร ภูมิทอง)

ผู้ใช้พัสดุ/ผู้ขอซื้อได้ตรวจรายการโดยละเอียดแล้ว ขอรับว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเชาวลิต กิระสัทธานนท์)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารก่อสร้าง

สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารก่อสร้าง								
1	รายการรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนวัสดุก่อสร้าง				20,000.00			20,000.00	รื้อขนไป
	1.2 งานรื้อขนทิ้ง								รื้อขนไป
	1.3 งานถมดิน								
	1.4 งานปรับดิน								
2	งาน คมอ 100*100	6.00	ตัน	1,400.00	8,400.00	66.00	396.00	8,796.00	
3	งานตั้งเสาปูนสำเร็จ 5*5	6.00	ตัน	750.00	4,500.00	66.00	396.00	4,896.00	
4	งานผูกเหล็กเทคาน 8 เมตร	8.00		400.00	3,200.00	200.00	1,600.00	4,800.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.							-	
	ปอกคาน 10*20 ซม.							-	
	ปูนคอนกรีตผสมสำเร็จ 240							-	
5	งานโครงหลังคา	27.84	ตร.ม.						
	แผ่นเมทัลชีส 0.35 ลอนเสปน	80.00	แผ่น	170.00	13,600.00	35.00	2,800.00	16,400.00	
	ครอบสันหลังคา	6.00	แผ่น	170.00	1,020.00	35.00	210.00	1,230.00	
	งานเหล็ก สี และค่าแรง	27.84	ตร.ม.	600.00	16,704.00	50.00	1,392.00	18,096.00	



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีปปอน ซัพพลาย
NIPPON SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีปปอน ซัพพลาย 5/2482 หมู่ 10 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แบบ ปร.4(ก)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารก่อสร้าง

สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	เทพื้นภายใน	24.51	ตร.ม.	200.00	4,902.00	120.00	2,941.20	7,843.20	
	ปูนคอนกรีตผสมสำเร็จ 240				-		-	-	
	ไวเมส และค่าแรง				-		-	-	
7	งานก่อฉาบ	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	300.00	3,900.00	8,450.00	
8	งานกระเบื้อง	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	200.00	3,600.00	11,700.00	
9	งานสี	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	
	งานกระจก	9.27	ตร.ม.	3,300.00	30,591.00	800.00	7,416.00	38,007.00	
	กระจกอลูมิเนียม 0.6 มม. และบานสวิง				-		-	-	
10	งานฝ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	350.00	350.00	1,850.00	
11	งานไฟฟ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
12	งานพื้นทางเดิน 2*8 เมตร ความหนา 10 ซม.	16.00	ตร.ม.	200.00	3,200.00	120.00	1,920.00	5,120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				124,767.00		27,971.20	152,738.20	

รายการประกอบแบบการก่อสร้าง

1. ความประสงค์

การดำเนินการก่อสร้างแบบที่หออาคารชุดนี้มีให้เป็นแนวทางในการก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดเข้าแบบ, ขนาดระยะ, การวางผังปัญหาอุปสรรคและแรงงานช่างฝีมือดีทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ได้งานที่เรียบร้อยปลอดภัยถูกต้องตามที่ต้องการ

2. การดำเนินการงานทั่วไป

2.1. ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมดตลอดจนหลักวิชาช่างที่เอกสารรายการประกอบแบบให้ถี่ถ้วนเสียก่อนลงมือทำการก่อสร้าง เพื่อจะได้ลำดับงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดล่าช้าขึ้นจะเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

3. การดำเนินการปักผัง

3.1. ให้ผู้รับจ้างปักผังและทำระดับให้ถูกต้อง ตามที่ปรากฏแบบแปลนและรายการประกอบแบบทุกประการ

3.2. ระดับ 0.00 ให้ถือระดับหลังถนนสาธารณะหรือให้ผู้รับจ้างกำหนดขนาดหน้า

3.3. ระดับขนาดและมิติต่างๆที่มีได้ระบุไว้กำหนดไว้เป็นเมตรทุกและต้องเป็นเกณฑ์

4. งานฐานรากและคานคอดิน

4.1. ฐานรากและคานคอดินเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดขนาดและรายการหลักให้ปฏิบัติตามแบบขยายปฏิบัติตามแบบขยายโครงสร้างทางวิศวกรรมและรายการประกอบแบบที่ปรากฏแบบแปลนทุกประการ

4.2. ในกรณีพื้นที่บริเวณก่อสร้างคอกเสาเข็มไม่ลง หรือรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้เกิน 6,000 กก./ตร.ม. ก็ไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็มได้ขนาดฐานรากยังคงมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดเดิม

5. งานคอนกรีต

5.1. งานคอนกรีตและงานปูนทั้งหมดเมื่อถอดแบบแล้วต้องได้ดังได้จาก, ระดับในทางราบส่วนของพื้น, เสาหรือคานในคอนกรีตที่จะต้องฝังเหล็ก, น็อต หรือปลอกกระหัด ให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต การยึดและการติดตั้งไม้แบบจะต้องทำให้แน่นหนาถ่วง ส่วนงานเสาฐานรากคอนกรีตทางวิศวกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและหลักวิชาการช่างที่ดี

6. งานก่ออิฐ, งานปูน

6.1. งานก่ออิฐจะต้อง, ได้ดัง, ได้จาก, ระดับ และหน้าอิฐเสมอกันตลอด หน้าก่ออิฐขนาดในช่องจะต้องมีเสาเอ็น และรอบประตู-หน้าต่าง, ทุกความสูง 2.00 เมตรและยาว 2.50 เมตรโดยยึดถือหลักวิชาการช่างที่ดี

6.2. การฉาบปูนให้ได้รับระดับและได้แนวความหนาของฉาบต้องไม่น้อยกว่า 1 ซม. และไม่หนากว่า 2.00 ซม. ส่วนการผสมปูนให้ดำเนินการกระทำวิธีของผู้ผลิต เมื่อฉาบเสร็จแล้วจะต้องไม่แตก ร้าว หรือแตกร่อน พร้อมเจาะร่อง, เรียบร้อยสวยงามและชัดเจน

7. งานพื้นอาคาร

7.1. พื้นอาคารโดยทั่วไปเป็นชั้น, คสล. หลังในที่ รายละเอียดตามแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างหรือตามที่ผู้รับจ้างเห็นชอบ

7.2. ระดับผิวในตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระดับที่กำหนดในแบบ ถ้าระดับขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

7.3. ระดับผิวในตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระดับที่กำหนดในแบบ ถ้าระดับขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

7.4.  พื้นปูกระเบื้องผิวเรียบ ขนาด 24" x 24"

7.6.  พื้น คสล. รัศมีหยาบ

8. งานผนัง

8.1. ผนัง  ก่ออิฐบล็อก 1/2 แผ่น หรือฉาบปูนทั้งสองด้าน

9. งานฝ้าเพดาน

9.1.  ฝ้ายิปซัมยี่ห้อมอร์ค หนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง  0.60 x 0.60 m. หรือให้กำหนดระดับก่อสร้าง

10. งานห้องน้ำ - ส้วม

10.1. พื้นห้องน้ำ - ส้วม ให้ถือระดับสูงจากระดับปกติ 0.10 เมตร หรือตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในแบบขยายห้องน้ำ - ส้วม หรือปฏิบัติตามคู่มืออาคารห้องน้ำ - ส้วม

10.2. รายละเอียดดูรอกันท์, ฐาน, รูปแบบลักษณะ, สี, ให้กำหนดระดับทำการก่อสร้างโดยศึกษารายชื่อกำหนดเขตพระราชวังปฏิบัติความคุณอาคาร

11. งานประตู่ - หน้าต่าง

11.1. รายละเอียดของประตูหน้าต่างให้กำหนดระดับทำการก่อสร้างจากผู้รับจ้าง โดยให้ศึกษาดูตามชื่อกำหนด ประตู - หน้าต่าง จากพระราชวังปฏิบัติความคุณอาคาร

12. งานสุขภิบาล

12.1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเดินท่อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา, ระบบระบายน้ำ, ปลอกกระโ - ปล่อซึม ฯลฯ โดยศึกษารายละเอียดตามข้อกำหนดระบบสุขาภิบาลพระราชวังปฏิบัติความคุณอาคาร

13. งานไฟฟ้า

13.1. รายละเอียดงานไฟฟ้าให้กำหนดระดับทำการก่อสร้างโดยให้ศึกษาข้อกำหนดระบบไฟฟ้าพระราชวังปฏิบัติความคุณอาคารหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14. งานสี

14.1. ให้ผู้รับจ้างทำการเตรียมผิวพื้นที่จะต้องทาสีให้เรียบหรือทาสีด้วยสี โดยรับผิดชอบผู้รับจ้างกำหนดระดับทำการก่อสร้าง การทาสีให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตทุกประการ



โครงการ ศาถาพระพุทธรูป

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

เขียนแบบ นายเอกธัช ขดประสิทธิ์ ปวส. ก่อสร้าง

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่

มาตรฐาน



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพสร ชัพพลาย 5/2482 หมู่ 10 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ปร.5(ก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพสร ชัพพลาย
SOPANORN SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

* งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารก่อสร้าง

* สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

จังหวัดสุพรรณบุรี

* หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

* แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	152,738.20	1.3091	199,949.58	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				199,949.58	
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	199,900.00 **



แบบ ปร.6

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพธร ซัพพลาย
NOTAKARN SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพธร ซัพพลาย 5/2482 หมู่ 10 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารก่อสร้าง

สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

จังหวัดกาญจนบุรี


หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 ทั้งหมด


จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567.

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	199,900.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	199,900.00	**

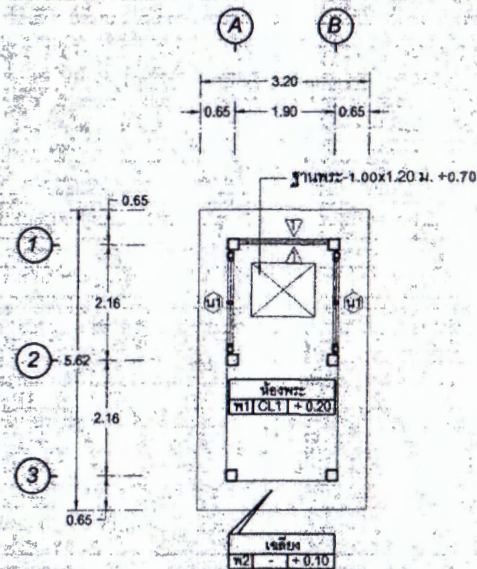

แบบแปลนพื้น
มาตราส่วน 1:100

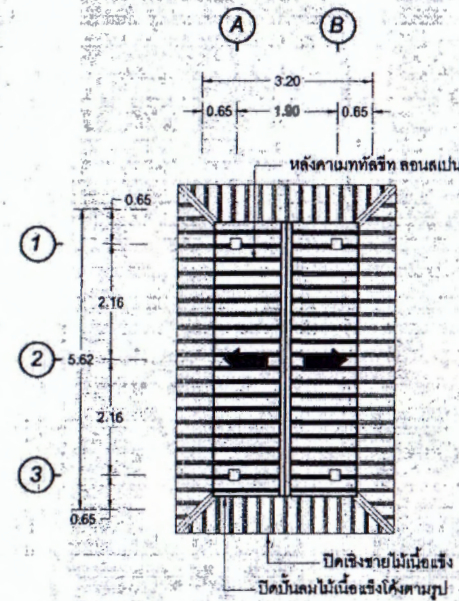

แบบแปลนหลังคา
มาตราส่วน 1:100



โครงการ ศาอาพระพุทธรูป

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยการอาชีพอุทอง


เขียนแบบ นายเอกชัย ชคประสิทธิ์ ปวส. ก่อสร้าง

แบบแสดง


รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่

มาตราส่วน

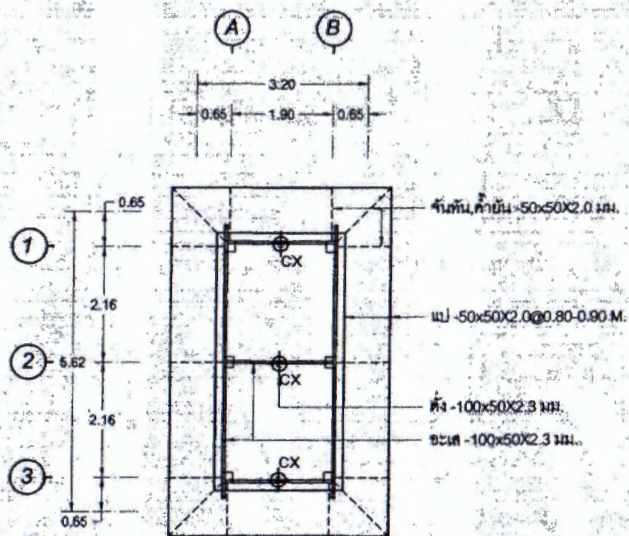

แบบแปลนหลังคากันสาด
มาตราส่วน 1:100

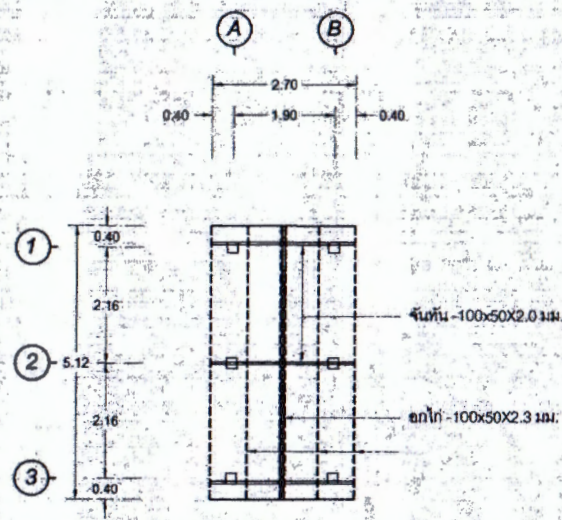

แบบแปลนหลังคาบน
มาตราส่วน 1:100



ทิศทางการมอง



โครงการ ศาลาพระพุทธรูป

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

เขียนแบบ นายเอกชัย ชลประสิทธิ์ ปวส. ก่อสร้าง

แบบแสดง


รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่


มาตราส่วน




ทิศทางการมอ

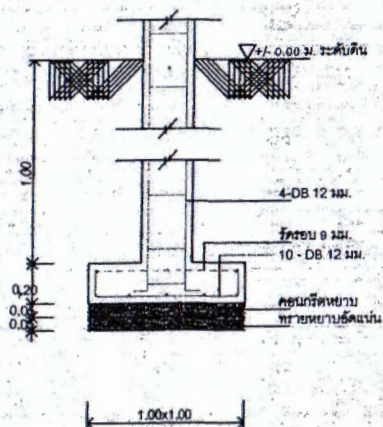


FOOTING F1 DETAIL
SCALE 1:20




แปลน F1
SCALE 1:20

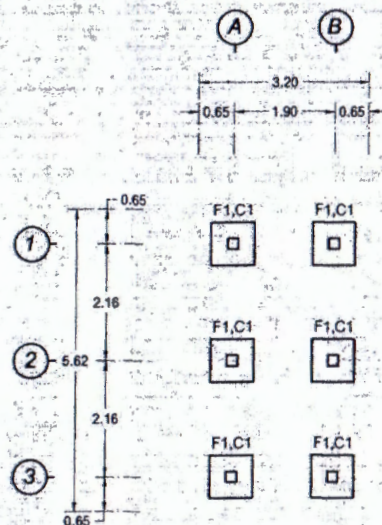


แบบแปลนฐานราก
มาตราส่วน 1:100

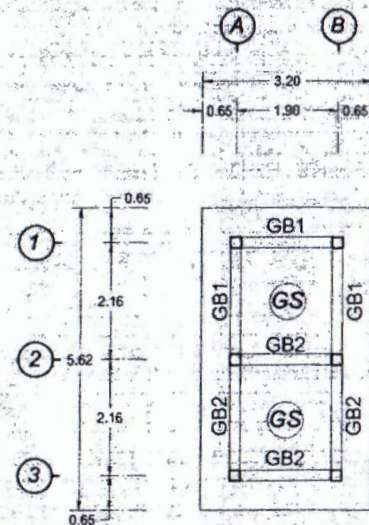


แบบแปลนคาน
มาตราส่วน 1:100

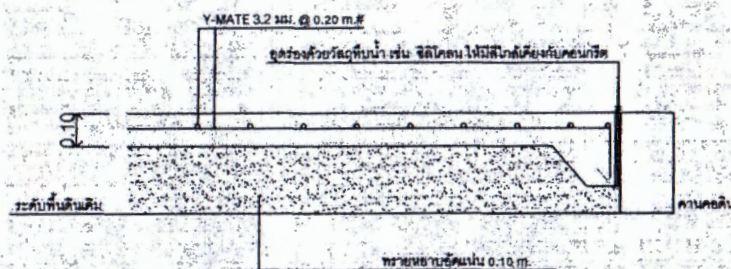

แบบขยายพื้น GS1



GB1



GB2



โครงการ ศาลาพระพุทธรูป

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

เขียนแบบ นายเอกชัย ขคประสิทธิ์ ปวส. ก่อสร้าง


แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่

มาตราส่วน

ป.1

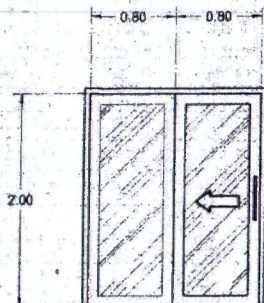


▼ ระดับพื้น

▼ ระดับพื้น

▼ ระดับพื้น

ลักษณะบาน	ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.70 x 2.05 ม.	ลักษณะบาน		ลักษณะบาน	
กรอบบาน	อลูมิเนียมระบบราง	กรอบบาน		กรอบบาน	
วงกบ	อลูมิเนียมระบบราง	วงกบ		วงกบ	
ลูกบิด	กระจกติดตาย หน้า 6 มม.	ลูกบิด		ลูกบิด	
บานพับ	ล้อเลื่อนรางแฉวง อย่างดี	บานพับ		บานพับ	
มือจับ-กลอน	มือจับพร้อมอุปกรณ์ล็อค	มือจับ-กลอน		มือจับ-กลอน	
อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์เสริม	
หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ	

น.1



▼ ระดับพื้น

▼ ระดับพื้น

▼ ระดับพื้น

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระจกติดตาย ขนาด 1.60 x 1.90 ม.	ลักษณะบาน		ลักษณะบาน	
กรอบบาน	อลูมิเนียมระบบราง	กรอบบาน		กรอบบาน	
วงกบ	อลูมิเนียมระบบราง	วงกบ		วงกบ	
ลูกบิด	กระจกติดตาย หน้า 6 มม.	ลูกบิด		ลูกบิด	
บานพับ	วีโก้ เปิดปิด อย่างดี	บานพับ		บานพับ	
มือจับ-กลอน	มือจับพร้อมอุปกรณ์ล็อค	มือจับ-กลอน		มือจับ-กลอน	
อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์เสริม	
หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ	



โครงการ ศาลาพระพุทธรูป

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

เขียนแบบ นายเอกชัย ชคประดิษฐ์ ปวส. ก่อสร้าง

แบบแสดง

แบบเลขที่

แบบขยายหน้าต่าง

มาตรฐาน

1-50



คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปัญญา	ตั้งโนปจัย	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุวรรณ	ศรีเที่ยงตรง	พนักงานราชการ (ครู)	กรรมการ
๓. นายปริญญา	ชัยพันธ์	ครู	กรรมการ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นายสายชล	ศิษย์ฤาษี	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุพจน์	ทางเนร	ครู	กรรมการ
๓. นายประยูร	ภูมิทอง	พนักงานราชการ (ครู)	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพิพัฒน์	ทองระอา	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒. นายเดชพล	จิตต์ใจฉ่ำ	ครู	กรรมการ
๓. นายปิยวิทย์	สุทธิวงศ์	พนักงานราชการ (ครู)	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายประยูร	ภูมิทอง	พนักงานราชการ (ครู)	ประธานกรรมการ
--------------	---------	---------------------	---------------

ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุให้ถูกต้อง อย่างเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นายชาติรี จำปาศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจการให้บริการ
ของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป
วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน □ หน้าข้อความที่เป็นจริง

1. เพศ □ ชาย □ หญิง

2. เป็นบุคลากร □ บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ □ อื่นๆ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป
วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน

รายการความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่					
2. ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายใน					
3. ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ในการปรับปรุง และพัฒนางานอาคารสถานที่					
4. ความพึงพอใจต่อความสามารถในการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหางานอาคารสถานที่					
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของงานอาคารสถานที่					

ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมทอง



รูปภาพ การรื้อถอนศาลาหลังเก่าเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมทอง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วัดวิทยาลัยการอาชีพอุทุม



รูปภาพ การตัดต้นไม้ เกลี่ยหน้าดินตัดรากไม้บริเวณศาลาพระพุทธรูป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุม



รูปภาพ งานขุดทำคาน วางคาน และกดเสาเข็ม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร



รูปภาพ งานก่อฉาบและทำโครงหลังคาพระพุทธรูป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วัดญาณการอาชีพอุทุม



รูปภาพ งานก่อฉาบ ปรับแต่ง และงานเทพื้น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร



รูปภาพ งานหลังคา งานปูกระเบื้องภายใน และงานทาสีภายใน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วัดญาณการอาชีพอุทุม



รูปภาพ งานฝ้า งานปูกระเบื้องภายนอก งานทาสีภายนอก และงานติดกระจก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุม



รูปภาพการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพอุทุม
